


島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2026年2月末現在）

1. 主要工程

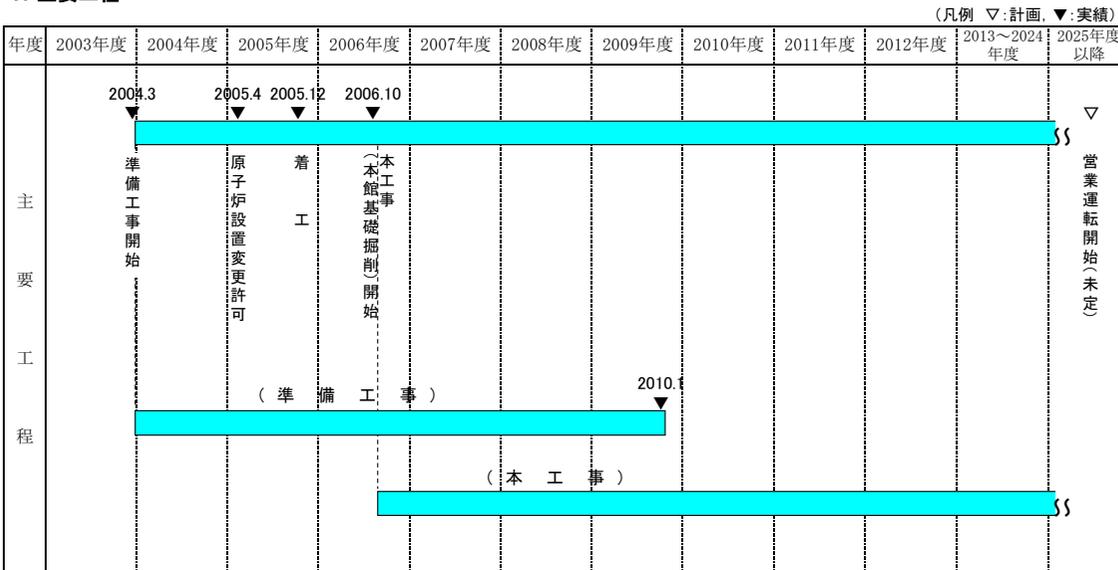

4. 建設工事概況

(1) 土木工事	(2) 建築工事	(3) 機械電気工事
<ul style="list-style-type: none"> フィル付ベント設備設置工事 地下式軽油タンク格納槽他設置工事 地下水位低下設備設置工事のうち揚水井戸他設置工事 ガスタービン発電機用軽油タンク基礎他設置工事 	<ul style="list-style-type: none"> 飛来物防護設備の設置 フィル付ベント設備設置工事(接続躯体設置工事) 地下式軽油タンク格納槽他設置工事(接続躯体接地工事) タービン建物屋根トラス補強工事(火山灰対策) 	<ul style="list-style-type: none"> 火災防護対策強化工事 静的触媒式水素処理装置設置工事 ガスタービン発電機の設置 フィル付ベント設備設置工事 非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事 機器・配管等の耐震補強工事 原子炉・燃料プールへの代替注水配管の敷設 逃がし安全弁駆動用の窒素ガスボンベの設置

2. 許認可状況

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
公有水面埋立免許	2003. 11. 10	2004. 2. 9	第1回工事計画認可(着工)	2005. 5. 31	2005. 12. 22
公有水面埋立竣功許可	-	2010. 1. 19	第2回工事計画認可	2006. 2. 28	2006. 10. 5
林地開発許可	2003. 6. 2	2004. 2. 23	第3回工事計画認可	2006. 11. 30	2007. 5. 22
原子炉設置変更許可	2000. 10. 4	2005. 4. 26	第4回工事計画認可	2007. 7. 31	2008. 4. 23
原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査)	2018. 8. 10	未定	第5回工事計画認可	2008. 5. 30	2008. 12. 26
電気工作物変更届出	2005. 5. 23	-	工事計画変更認可(洗滌廃液処理装置)	2009. 7. 24	2009. 10. 14
燃料設備使用承認	2010. 8. 5	2010. 8. 27	工事計画変更認可(排ガス再結合器)	2009. 10. 15	2009. 11. 9
			工事計画軽微変更届出	2012. 1. 5	-
			工事計画変更認可(排気筒)	2013. 5. 20	2013. 7. 1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.-%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

5. 建設工事状況写真

