


島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2023年11月末現在）

1. 主要工程

(凡例 ▽:計画, ▼:実績)

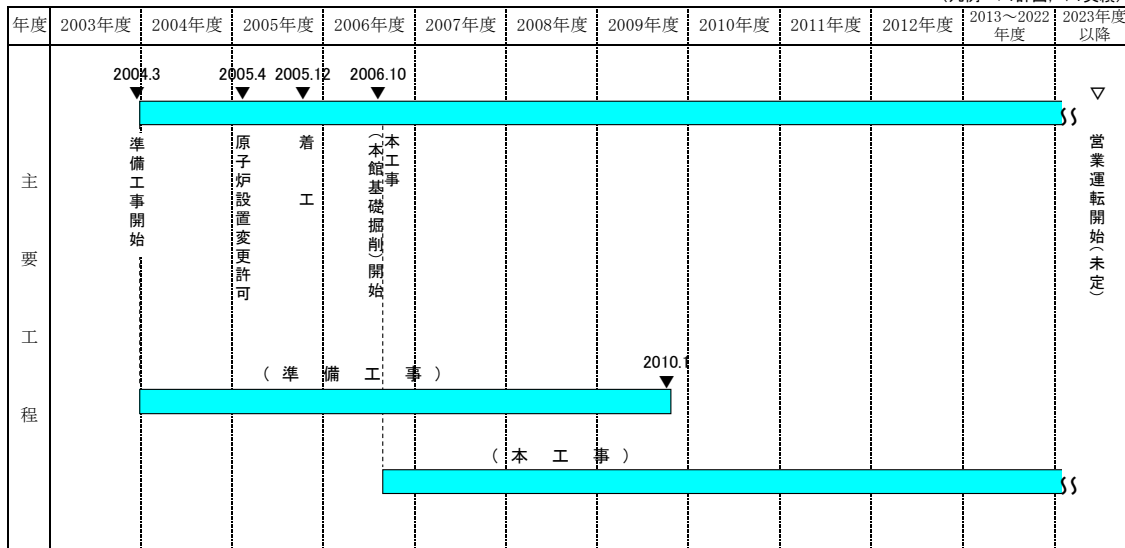

4. 建設工事概況

(1) 土木工事	(2) 建築工事	(3) 機械電気工事
<ul style="list-style-type: none"> フィルタ付ベント設備設置工事 地下式軽油タンク格納槽他設置工事 		<ul style="list-style-type: none"> 火災防護対策強化工事 静的触媒式水素処理装置設置工事 ガスタービン発電機の設置 フィルタ付ベント設備設置工事 非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事

2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	2003.11.10	2004.2.9	●第1回工事計画認可(着工)	2005.5.31	2005.12.22
●公有水面埋立竣功許可	-	2010.1.19	●第2回工事計画認可	2006.2.28	2006.10.5
●林地開発許可	2003.6.2	2004.2.23	●第3回工事計画認可	2006.11.30	2007.5.22
●原子炉設置変更許可	2000.10.4	2005.4.26	●第4回工事計画認可	2007.7.31	2008.4.23
●原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査)	2018.8.10	未定	●第5回工事計画認可	2008.5.30	2008.12.26
●電気工作物変更届出	2005.5.23	-	●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	2009.7.24	2009.10.14
●燃料設備使用承認	2010.8.5	2010.8.27	●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	2009.10.15	2009.11.9
			●工事計画軽微変更届出	2012.1.5	-
			●工事計画変更認可(排気筒)	2013.5.20	2013.7.1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.-%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

5. 建設工事状況写真



敷地東側からの全景
