


島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2025年3月末現在）

1. 主要工程

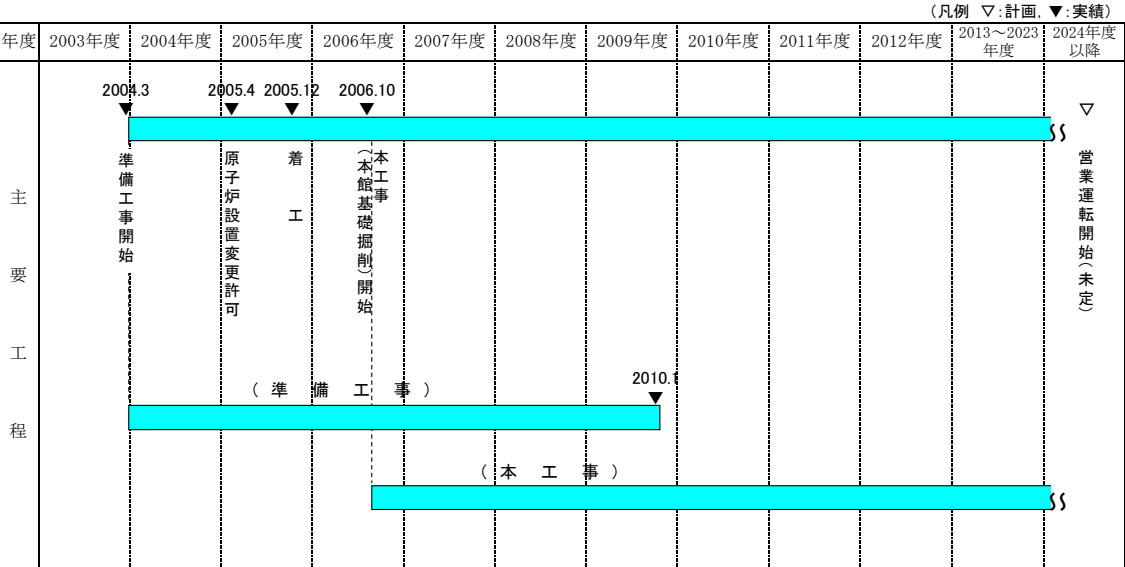

4. 建設工事概況

| (1)土木工事                                                                        | (2)建築工事 | (3)機械電気工事                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>・フィルタ付ベント設備設置工事<br/>・地下式軽油タンク格納槽他設置工事<br/>・地下水位低下設備設置工事のうち揚水井戸他設置工事</div> |         | <div>・火災防護対策強化工事<br/>・静的触媒式水素処理装置設置工事<br/>・ガスタービン発電機の設置<br/>・フィルタ付ベント設備設置工事<br/>・非常用ディーゼル発電設備軽油タンク設置工事<br/>・機器・配管等の耐震補強工事</div> |

2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

| 項 目                    | 提出日          | 許認可日        | 項 目                 | 提出日          | 許認可日         |
|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| ●公有水面埋立免許              | 2003. 11. 10 | 2004. 2. 9  | ●第1回工事計画認可(着工)      | 2005. 5. 31  | 2005. 12. 22 |
| ●公有水面埋立竣功許可            | -            | 2010. 1. 19 | ●第2回工事計画認可          | 2006. 2. 28  | 2006. 10. 5  |
| ●林地開発許可                | 2003. 6. 2   | 2004. 2. 23 | ●第3回工事計画認可          | 2006. 11. 30 | 2007. 5. 22  |
| ●原子炉設置変更許可             | 2000. 10. 4  | 2005. 4. 26 | ●第4回工事計画認可          | 2007. 7. 31  | 2008. 4. 23  |
| ●原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査) | 2018. 8. 10  | 未定          | ●第5回工事計画認可          | 2008. 5. 30  | 2008. 12. 26 |
| ●電気工作物変更届出             | 2005. 5. 23  | -           | ●工事計画変更認可(洗滌廃液処理装置) | 2009. 7. 24  | 2009. 10. 14 |
| ●燃料設備使用承認              | 2010. 8. 5   | 2010. 8. 27 | ●工事計画変更認可(排ガス再結合器)  | 2009. 10. 15 | 2009. 11. 9  |
|                        |              |             | ●工事計画軽微変更届出         | 2012. 1. 5   | -            |
|                        |              |             | ●工事計画変更認可(排気筒)      | 2013. 5. 20  | 2013. 7. 1   |

3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.-%

新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

5. 建設工事状況写真

